



РОСАТОМ



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

О ходе реализации Межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» в 2016 году

Заседание Комиссии государств участников
СНГ по использованию атомной энергии в
мирных целях
20 июля 2017 года

Генеральный директор АО ФЦЯРБ
Голиней Андрей Иванович

Межгосударственная целевая программа

Государства – участники МЦП и распределение финансирования:



15%

Республика
Казахстан



5%

Кыргызская
Республика



75%

Российская
Федерация




5%

Республика
Таджикистан

Основной задачей МЦП является снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций с радиоэкологическими последствиями на территориях государств-членов, подвергшихся воздействию уранодобывающих и перерабатывающих производств, отработка безопасности условий проживания и социальной реабилитации населения в этих регионах.


Объекты Межгосударственной целевой программы в Кыргызской Республике

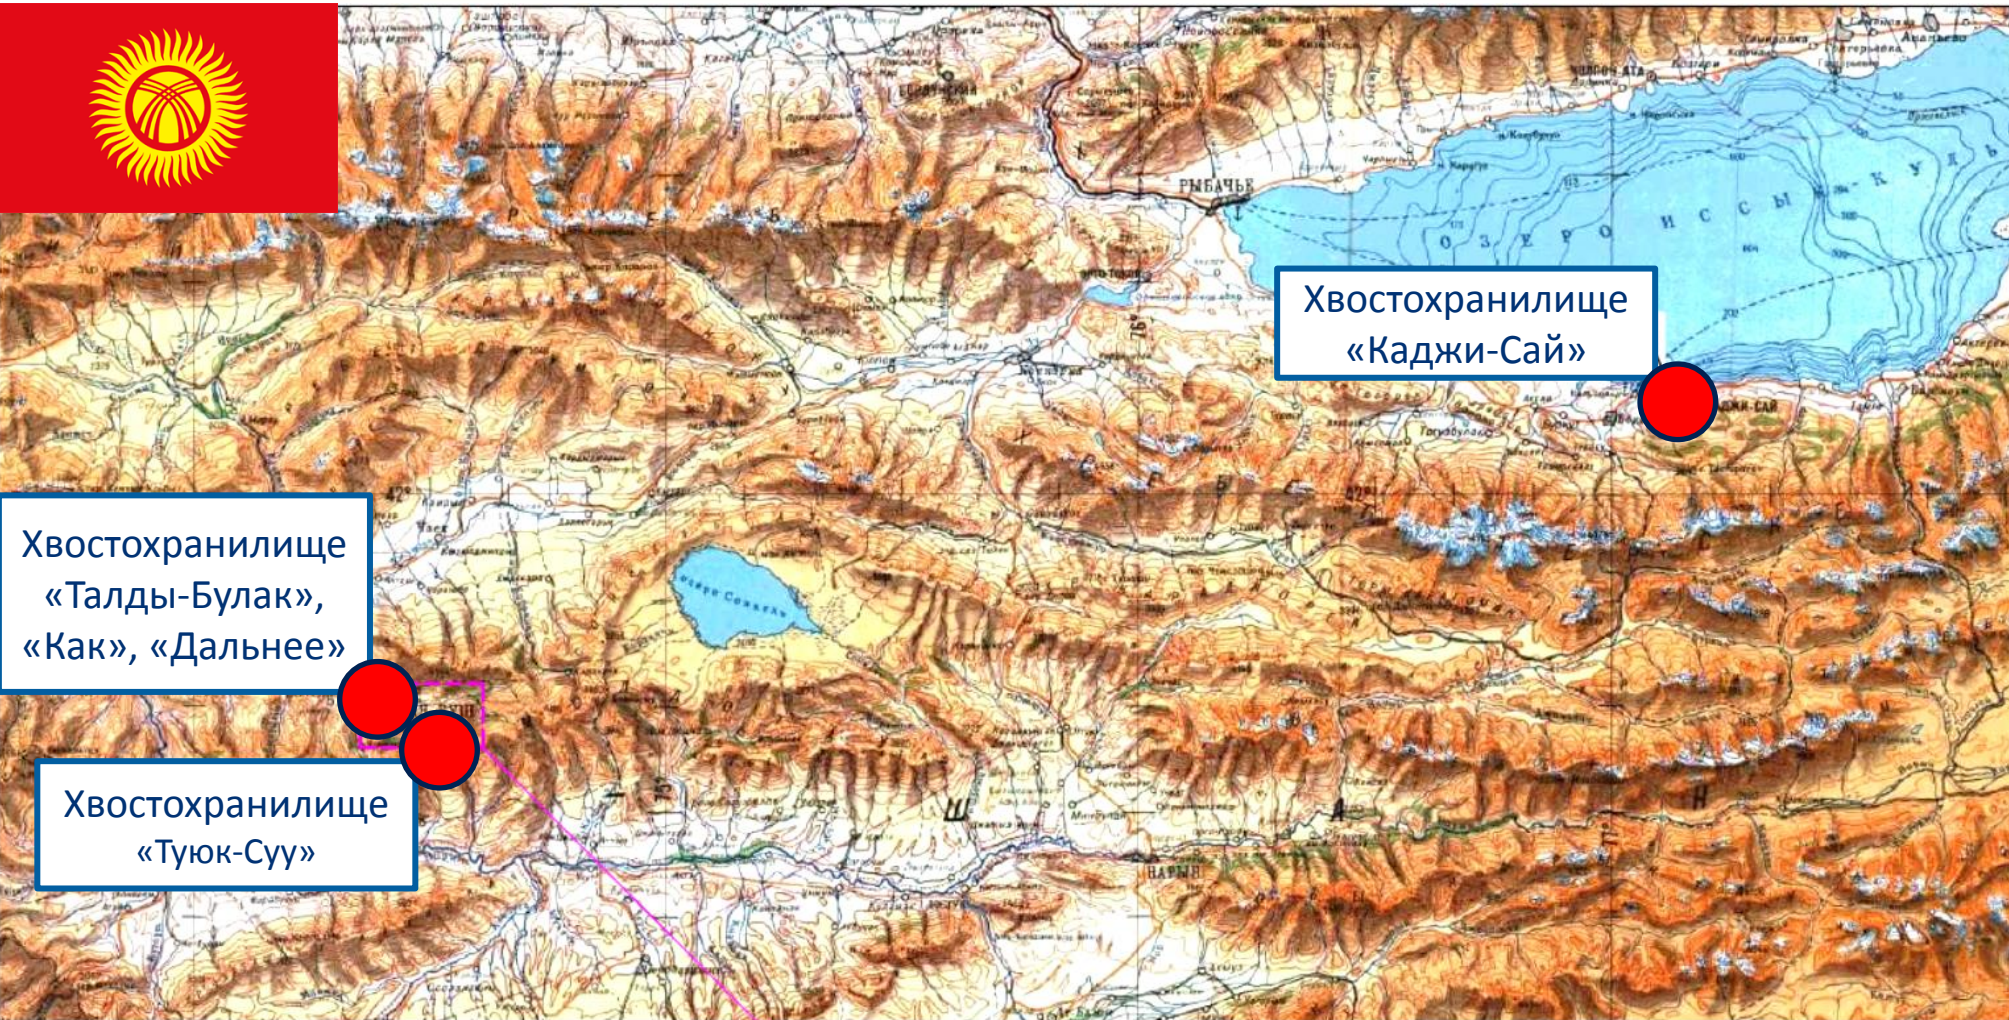





Объекты Межгосударственной целевой программы в Республике Таджикистан

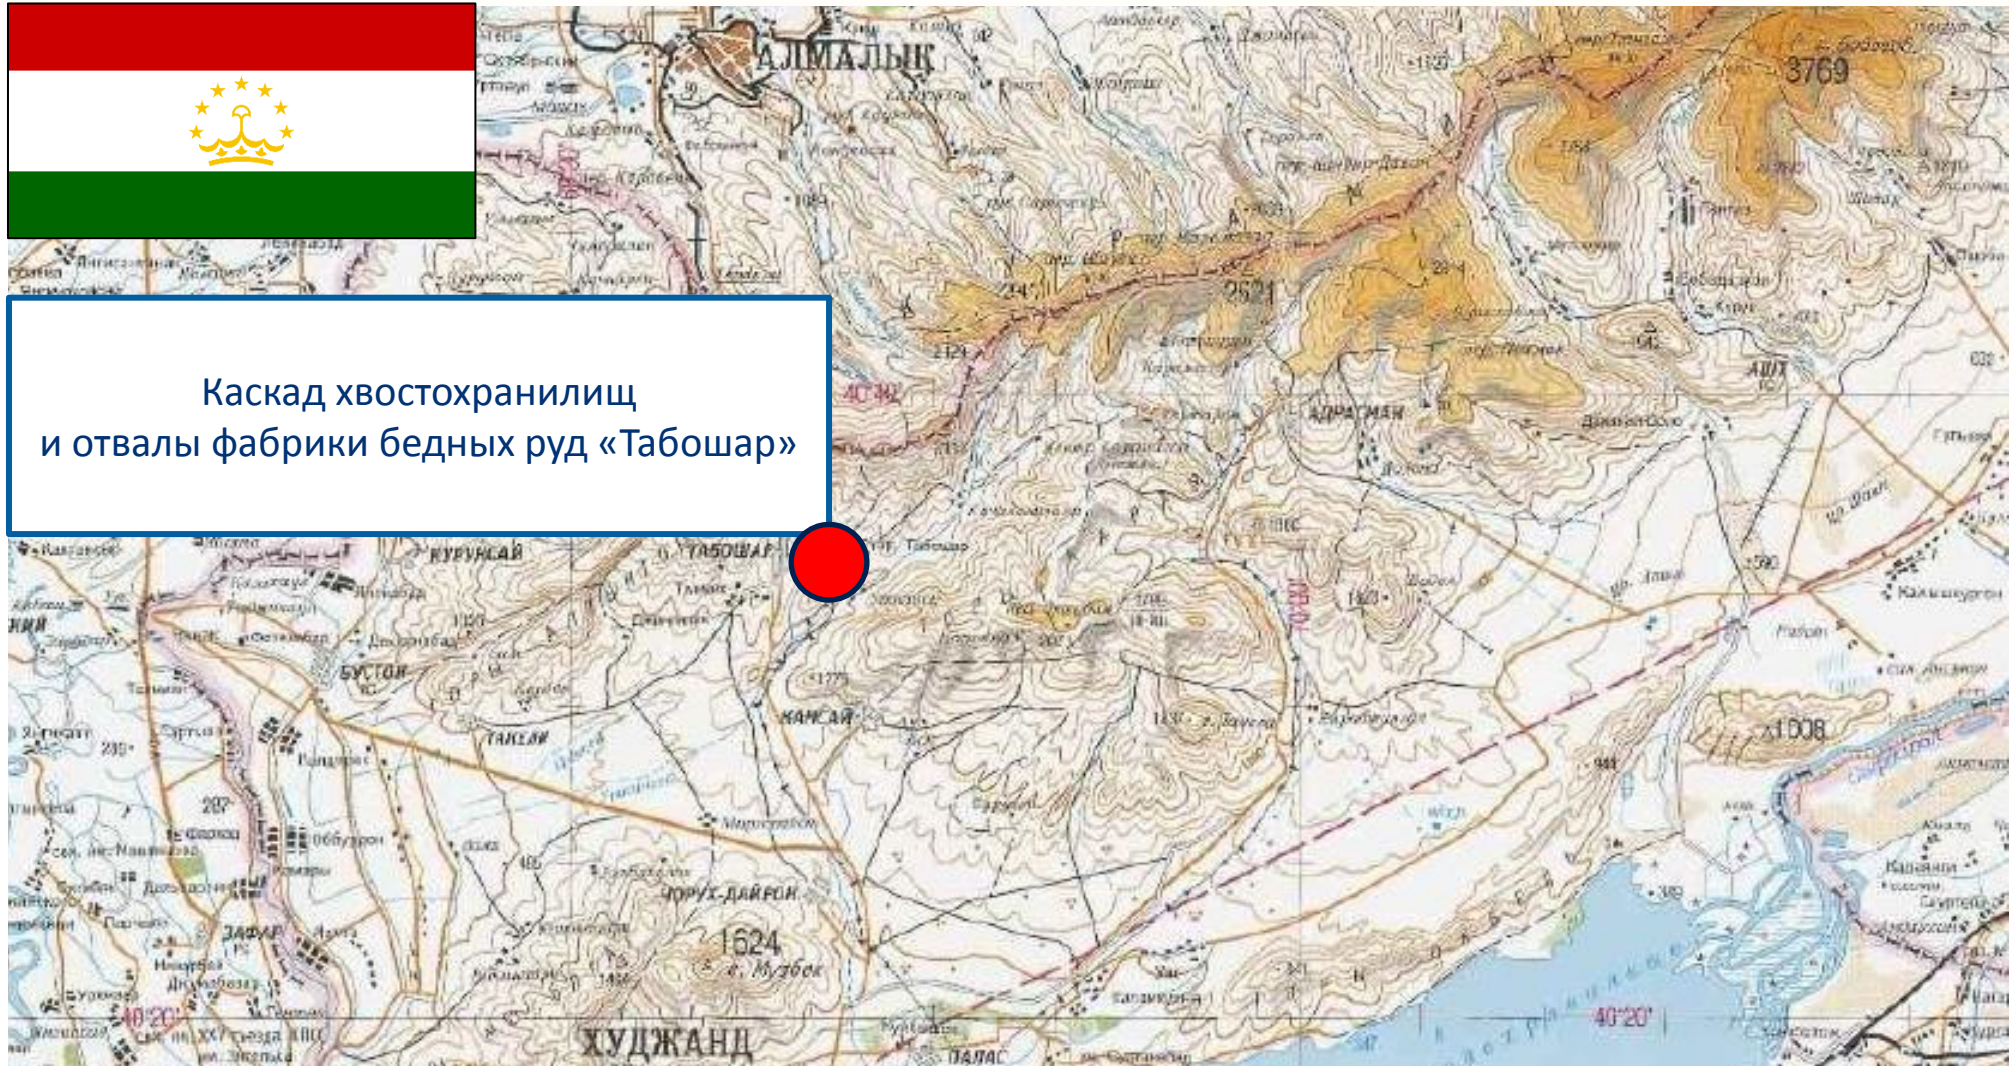

Каскад хвостохранилищ
и отвалы фабрики бедных руд «Табошар»



Основные этапы МЦП

1 этап	Исследовательские работы	2013-2014	
	Проектно-изыскательские работы	2015-2016	
	Экспертиза проектной документации	2016	
	Строительно-монтажные работы (подготовительный этап)	2016	
2 этап	Строительно-монтажные работы	2017-2023	
	Экологический и социально-гигиенический мониторинг	2017-2023	



- **выполнено.**



- **выполняется.**

Итоги работ в Кыргызской Республике

- ✓ Разработан ОВОС, проведены общественные слушания.
- ✓ Выполнены комплексные инженерные изыскания.
- ✓ Разработана проектная документация по всем объектам Программы.
- ✓ 28 марта 2016 года получены положительные заключения на проектную документацию от следующих экспертных органов:
 - Утверждены проектно-технические решения в Госэкспертизе Кыргызской Республики
 - Экспертиза промышленной безопасности
 - Государственная экологическая экспертиза
- ✓ По инициативе Кыргызской стороны проведена экспертиза проектной документации специалистами МАГАТЭ.

Итоги работ в Кыргызской Республике

 **Заключен государственный контракт на разработку рабочей документации.**

Проводятся конкурсные процедуры на выполнение строительного-монтажных работ.

Итоги работ в Республике Таджикистан

- ✓ Разработан ОВОС, проведены общественные слушания.
- ✓ Выполнены комплексные инженерные изыскания.
- ✓ Завершен сбор исходно разрешительной документации, получены:
 - Сертификат на земельный участок под объектами рекультивации
 - Техническое условия на подключение к инженерным сетями
 - Справки о гидрометеорологических и климатических характеристиках
 - Другие справки необходимые в качестве исходных данных в количестве 11 шт.
- ✓ Разработана проектная документация по всем объектам Программы.
- ✓ Получены положительные заключения государственной экологической экспертизы

Итоги работ в Республике Таджикистан



Проектная документация согласована в:

- Агентстве по ядерной и радиационной безопасности АН Республики Таджикистан
- Санитарно-эпидемиологическом надзоре
- Службе связи при Правительстве РТ и Службе государственного противопожарного надзора при МВД РТ



По инициативе Таджикской стороны проведена экспертиза проектной документации специалистами МАГАТЭ.



Подписан договор на экспертизу с управлением вневедомственной экспертизы Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан

Заседание Совета глав правительств СНГ 28 октября 2016 года, Минск

Решение Совета глав правительств СНГ от 28 октября 2016 г.:

- Внести изменения в Программу.
- Утвердить долевые взносы государств-участников Программы.
- Правительствам государств-участников Программы перечислять средства на счет ИК СНГ

Государства – участники СНГ	Долевое участие государства, %	Долевое участие государства, тыс. российских рублей*
Российская Федерация	75	2 176 916,60
Республика Казахстан	15	433 583,32
Кыргызская Республика	5	144 527,77
Республика Таджикистан	5	144 527,77
Итого	100	2 890 555,46



СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
СОВЕТ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ

РЕШЕНИЕ

от 28 октября 2016 года

город Минск

о внесении изменений в Межгосударственную целевую программу «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств»

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств

решил:

1. Внести изменения в Межгосударственную целевую программу «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» (в редакции Решения Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2015 года) согласно приложению.

2. Утвердить долевые взносы государств, участвующих в финансировании Межгосударственной целевой программы, на ее реализацию в 2017 году в общей сумме 403 322,33 тыс. российских рублей, в том числе долевые взносы Республики Казахстан – 60 498,35 тыс. российских рублей, Кыргызской Республики – 20 166,12 тыс. российских рублей, Российской Федерации – 302 491,75 тыс. российских рублей и Республики Таджикистан – 20 166,12 тыс. российских рублей.

3. Правительствам государств – участников указанной программы перечислять денежные средства на финансирование ее мероприятий на отдельный счет Исполнительного комитета СНГ, открытый в соответствии с Решением Совета глав правительств СНГ от 21 ноября 2014 года.

От Азербайджанской Республики

От Российской Федерации

От Республики Армения

От Республики Таджикистан
(Соловьев)

От Республики Беларусь

От Туркменистана

От Республики Казахстан

От Республики Узбекистан

От Кыргызской Республики

От Украины

От Республики Молдова

Минск – 28.10.2016

16-1573-54

Изменение Программы

Решением Совете Глав Правительств СНГ от 28.10.2016 в Программу внесены изменения:

В редакции Программы 29 мая 2015 года :

2 этапа (2013 - 2016 и 2017 - 2018), бюджет 1 155 971,03 тыс. руб.



Увеличение сроков на 5 лет (до 2023 года).
Увеличение стоимость на 1 734 584 тыс. рос. рублей.

В редакции Программы 28 сентября 2016 года:

2 этапа (2013 - 2016 и 2017 - 2023), бюджет 2 890 555,46 тыс. руб.*



Начало строительно-монтажных работ в **Таджикистане** предусмотрено в **2020 году**. Соответствующие изменения в Программу планируется утвердить Решением Совета Глав Правительств стран - участниц Программы в 1-м полугодии 2018 г.

* С учетом стоимости выполнения работ по рекультивации выбранных объектов Республики Таджикистан в соответствии со структурой цены на выполнение строительно-монтажных работ г. Истиклол (Республика Таджикистан) по состоянию на 2011 год, которая подлежит корректировке и утверждению на уровне Совета глав правительств СНГ.

Объемы средств на реализацию Программы в 2016 году, тыс. российских рублей

<i>Государства –участники Программы</i>	<i>Предусмотрено в Программе</i>	<i>Фактически поступило</i>	<i>Отклонение</i>	<i>Переплата (+)/ Задолженность (-) нарастающим итогом 2013-2016</i>
Республика Казахстан 	37 900,3	-	-37 900,3	-43 971,2
Кыргызская Республика 	12 633,4	5 324,02	-7 309,38	-7 309,38
Российская Федерация 	189 501,4	189 501,4	0,0	0,0
Республика Таджикистан 	12 633,4	2 024,0	-10 609,4	-11 783,78
Всего	252 668,5	195 849,42	-55 819,08	-63 064,36

Перечень работ бизнес-плана выполненных за отчетный период, тыс. российских рублей

Год факт. выполнения	Наименование мероприятий	Стоимость работ по Программе	Поступило из бюджета	Выполнено работ/оплачено работ
	1. Реализация Программы:			
2015	1.1. Обоснование и выбор прогрессивных технологий по рекультивации выбранных объектов, находящихся на территориях Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.*	9 881,40		9 881,4/ 0,00
	1.2. Разработка проектной документации:			
2015	1.2.1. пгт. Мин-Куш (Кыргызская Республика).*	19 340,65		19 340,65/ 0,00
2015	1.2.2. пгт. Каджи-Сай (Кыргызская Республика).*	3 614,64		3 614,64/ 0,00
2016	1.2.3. г. Истиклол (Республика Таджикистан).	24 748,00		24 748,00/ 0,00
2016/-	1.3. Рассмотрение проектной документации в органах госнадзора Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.*	3 489,00		993,06/0,00

Перечень работ бизнес-плана выполненных за отчетный период, тыс. российских рублей

Год факт. выполнения	Наименование мероприятий	Стоимость работ по Программе	Поступило из бюджета	Выполнено работ/оплачено работ
	1.4. Разработка рабочей документации:			
	1.4.1. пгт. Мин-Куш (Кыргызская Республика).	32 234,37		1 332,38/1 332,38
	1.4.2. пгт. Каджи-Сай (Кыргызская Республика).	6 024,69		-
	1.4.3. г. Истиклол (Республика Таджикистан).	41 246,41		-
	1.5. Проведение строительно-монтажных работ:			
	1.5.1. пгт. Мин-Куш (Кыргызская Республика).	51 403,59		-
	1.5.2. пгт. Каджи-Сай (Кыргызская Республика).	-		-
	1.5.3. г. Истиклол (Республика Таджикистан).	51 540,06		-
2016	2. Управление программой	9 145,63**		1 399,51/0,00
	ИТОГО по мероприятиям 2016 года Программы	252 668,44	196 849,42	61 309,64/1 332,38
	Не профинансировано		55 819,08	
	Не выполнено работ			191 477,62

Выводы и предложения

- 1. Мероприятия первого этапа Программы, предусмотренные в 2016 году, на территории Республики Таджикистан выполнены не в полном объеме по следующим причинам:**
 - сложными инженерно-геологическими и геодезическими условиями;
 - различиями в нормативной базе при оформлении исходно-разрешительной документации;
 - существенными сроками выполнения лабораторных анализов.
- 2. Мероприятия первого этапа Программы, предусмотренные в 2016 году, на территории Кыргызской Республики, выполнены не в полном объеме по причине несостоявшихся конкурсных процедур на проведение строительно-монтажных работ.**



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
